

2026

Bilan triennal d'animation

Période mars 2023 - mars 2026

Site Natura 2000 FR7200795
Tunnel de Saint Amand de Coly

Coly Saint-Amand (24)



SOMMAIRE

Sommaire	1
Liste des figures	2
Liste des tableaux	2
Intervenants	3
Présidence du Comité de Pilotage.....	3
Structure animatrice.....	3
Préambule	4
Site Natura 2000 et enjeux de conservation	4
Objectifs du Docob	6
Bilan triennal d'animation	7
Objet et périmètre du bilan.....	7
Analyse des résultats au regard de la commande régionale (CCTP)	7
Adéquation du CCTP aux enjeux	7
Forces identifiées.....	7
Limites identifiées.....	7
Bilan cartographique	9
Analyse de la mise en œuvre du DOCOB.....	11
Bilan de la mise en œuvre du DOCOB détaillé par action	11
Discussion des résultats.....	14
Perspectives pour la prochaine phase d'animation.....	18

Référence à utiliser

QUERO N., 2026. Bilan triennal d'animation du site Natura 2000 FR7200795 « Tunnel de Saint Amand de Coly ». Convention cadre Région/Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, 19p

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Périmètre du site Natura 2000	4
Figure 2: Grands Rhinolophes en léthargie	5
Figure 3: Barbastelles d'Europe en léthargie.....	5
Figure 4: Bilan cartographique des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la période 2023-2026	10

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Objectifs de sites et objectifs opérationnels.....	6
Tableau 2: Synthèse du programme d'action 2023-2026.....	8
Tableau 3: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB.....	12
Tableau 4: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB – suite	13
Tableau 5: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB	15
Tableau 6: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB - suite	16
Tableau 7: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB - suite et fin.....	17

INTERVENANTS

PRESIDENCE DU COMITE DE PILOTAGE

Dans le cadre de la prise de compétence au 1^{er} janvier 2023 par la Région Nouvelle-Aquitaine de la gestion des sites terrestres Natura 2000, la Présidence par délégation du Président de la Région Nouvelle-Aquitaine est assurée par Nathalie ARNAUD, élue régionale.

STRUCTURE ANIMATRICE

Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine a été désigné structure animatrice du site Natura 2000 dans le cadre du marché public de prestations intellectuelles « Animation du Document d'objectifs de sites Natura 2000 sur les territoires de la Dordogne (24), de la Corrèze (19), de la Vienne (86) et de la Creuse (23) » référencé sous le numéro 20221000^E07591 proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine.

L'animation du site est assurée par Nolwenn QUERO, chargée de missions au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, antenne de Dordogne située au 212 Boulevard des Saveurs, 24 660 Coulounieix-Chamiers.

PREAMBULE

Le site Natura 2000 « Tunnel de Saint-Amand-de-Coly » se situe dans le Périgord noir, sur le canton de Montignac, à mi-chemin entre Sarlat et Périgueux. Coly Saint-Amand se situe à l'extrémité orientale du canton, à la périphérie du canton voisin de Terrasson.

Le site couvre une superficie de **62,78 hectares**, périmètre ajusté en 2006 lors de l'élaboration du Document d'objectifs, sur la commune de Coly Saint-Amand dans le département de Dordogne. Il comprend le tunnel SNCF, son emprise au sol complétée par une zone « tampon » constituée de boisements (taillis de feuillus essentiellement) et de prairies.



Site Natura 2000 FR7200795 "Tunnel de Saint Amand de Coly"

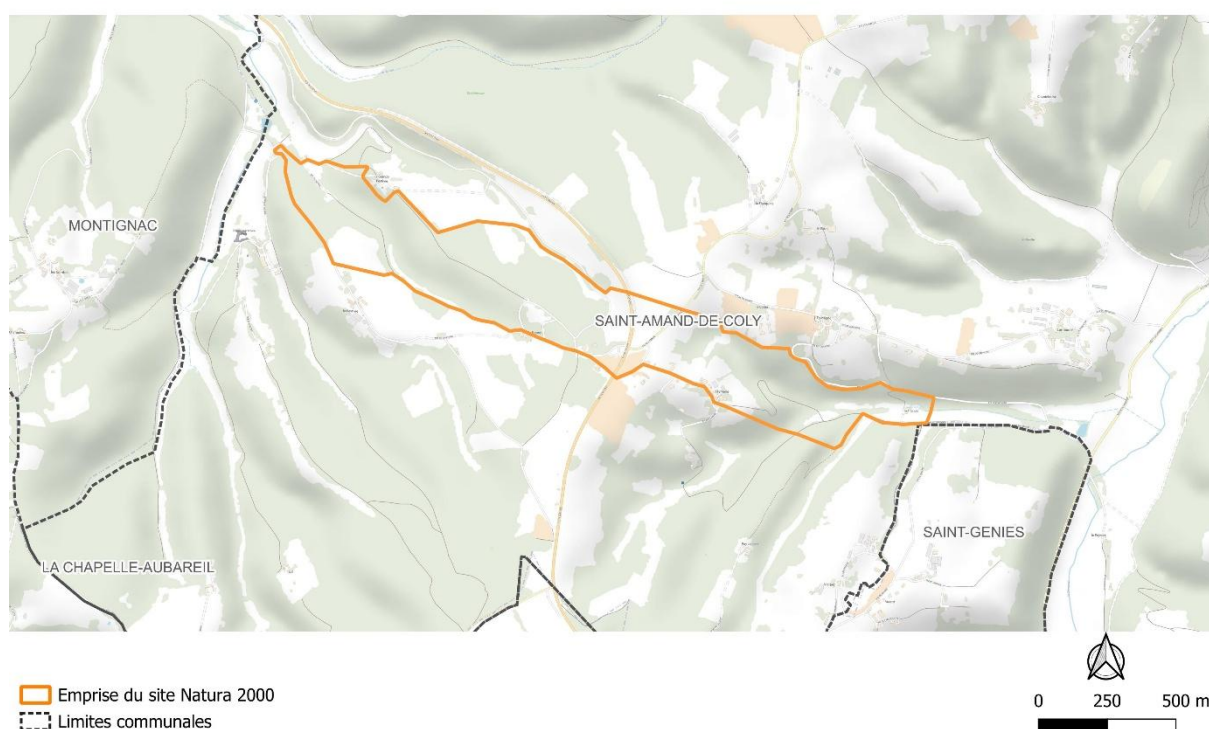


Figure 1: Périmètre du site Natura 2000

Le Document d'Objectifs, élaboré par le CEN Aquitaine en tant qu'opérateur, a été validé par le Comité de pilotage (COPIL) le 23 mars 2006.

SITE NATURA 2000 ET ENJEUX DE CONSERVATION

Le site correspond à un gîte d'intérêt majeur pour la préservation des chauves-souris en période de léthargie hivernale.

Espèces d'intérêt communautaire :

- ✓ Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*) – 1304
- ✓ Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*) – 1303
- ✓ Rhinolophe euryale (*Rhinolophus euryale*) – 1305
- ✓ Barbastelle d'Europe (*Barbastella barbastellus*) – 1308

- ✓ Vespertilion à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*) – 1321
- ✓ Grand Murin (*Myotis myotis*) – 1324 ou Petit Murin (*Myotis blythii*) – 1307
- ✓ Minioptère de Schreibers (*Miniopterus Schreibersii*) – 1310



Figure 2: Grands Rhinolophes en léthargie

Ainsi, à l'échelle du site, **2 types d'enjeux** ont été définis :

- ✓ la gestion et le suivi du gîte à chauve-souris ;
- ✓ l'animation et la valorisation du site et de ses enjeux.



Figure 3: Barbastelles d'Europe en léthargie

OBJECTIFS DU DOCOB

Quatre objectifs de site ont été définis et déclinés en dix objectifs opérationnels :

Tableau 1: Objectifs de sites et objectifs opérationnels

O₁	Conserver les espèces d'intérêt communautaires
O ₁₁	Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies de chauves-souris
O₂	Evaluer la conservation des espèces
O ₂₁	Suivre les colonies de chauves-souris sur l'ensemble du cycle biologique
O ₂₂	Suivre les conditions hygrothermiques du site
O ₂₃	Améliorer les connaissances concernant la présence des colonies en hiver
O ₂₄	Connaître la présence des deux espèces en période de reproduction
O₃	Valoriser et sensibiliser
O ₃₁	Mettre en place de la sensibilisation ex-situ
O₄	Animer le DOCOB
O ₄₁	Préparer la mise en œuvre du document d'objectifs
O ₄₂	Mettre en œuvre des mesures contractuelles
O ₄₃	Mettre en œuvre des mesures hors contrat
O ₄₄	Coordonner, réaliser la synthèse et le bilan

BILAN TRIENNAL D'ANIMATION

OBJET ET PERIMETRE DU BILAN

Le présent rapport constitue la synthèse triennale des actions d'animation du site Natura 2000, réalisée en fin de troisième année d'exécution de la mission confiée par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Elle vise à :

- ✓ Apprécier l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire,
- ✓ Analyser les résultats obtenus au regard de la commande régionale (CCTP),
- ✓ Identifier les forces et limites de la mise en œuvre,
- ✓ Dégager des perspectives d'adaptation pour les programmes d'animation futurs.

ANALYSE DES RESULTATS AU REGARD DE LA COMMANDE REGIONALE (CCTP)

ADEQUATION DU CCTP AUX ENJEUX

L'analyse du bilan triennal montre une bonne adéquation du CCTP avec :

- ✓ les enjeux biologiques du site,
- ✓ le contexte local,
- ✓ les moyens humains et techniques mobilisés.

La commande régionale a permis :

- ✓ la continuité des suivis biologiques,
- ✓ une animation administrative conforme aux obligations réglementaires,
- ✓ une assistance technique et une évaluation des besoins pour le site

Le Tableau 2 en page suivante présente une synthèse des actions menées dans le cadre du programme d'animation 2023-2026.

FORCES IDENTIFIEES

- ✓ Priorisation efficace des actions à forte valeur ajoutée écologique.
- ✓ Gouvernance fonctionnelle (COPIL, bilans, reporting).
- ✓ Intégration du site dans des dynamiques partenariales régionales.
- ✓ Implication dans le réseau des animateurs régional et du CEN Nouvelle-Aquitaine
- ✓ Implication des acteurs locaux autour du site

LIMITES IDENTIFIEES

- ✓ Outils inopérants rendant impossible certaines actions : outil SIN2 déconnecté mais non remplacé, interface pour la mise à jour du FSD non déployé à ce stade.

Tableau 2: Synthèse du programme d'action 2023-2026

		2023-2024	2024-2025	2025-2026	Résultats
1-Animation	1-1 Poursuivre les actions de sensibilisation, d'information, de communication				
	Sites Internet	x	x	x	- site internet maintenu et actualisé régulièrement, documents de référence accessibles.
	Articles dans les journaux		x	x	- article synthétique rédigé pour la page Internet de la CCVH - article détaillé rédigé pour le bulletin communal
	1-1 Organisation et animation de sorties de terrain pour le grand public ou les scolaires	x		x	- un ciné débat réalisé
	1-2 Échanger avec d'autres animateurs de sites Natura 2000	x	x	x	- participation à plusieurs réseaux et temps d'échanges inter-animateurs.
		2023-2024	2024-2025	2025-2026	Résultats
2-Assistance technique	2-1 Contractualisation des actions du DOCOB				
	Recensement et contact des signataires potentiels				- action non programmée pendant la période considérée
	Assistance technique et administrative des signataires				
	Suivi et évaluation des contrats				
	Renseignement dans le système d'information des sites Natura 2000 « SIN2 »	x			- outil complété avec les données relatives à la contractualisation sur site. Arrêt de SIN 2 entre le 31 décembre 2024 et le 31 janvier 2025.
	2-2 Natura 2000 dans les politiques publiques	x	x	x	
	2-3 Assistance technique				
	Régime d'évaluation des incidences Natura 2000	x	x	x	- pas de sollicitation pendant la période considérée
	Assistance technique des porteurs de projet	x	x	x	- réponse à sollicitation du PIP pour la création d'une exposition pour le Grand Site - participation à la pose de panneaux AAPB sur site
	2-4 Actions non contractuelles (hors contrats Natura 2000)	x	x	x	-intégration du site dans des programmes (Chiroptères cavernicoles prioritaires en Nouvelle-Aquitaine) et projets partenariaux (FNE NA, SFEPM, ...)
	Phase de programmation				
	Phase de mise en œuvre				
	2-5 Réunions avec les services de la Région Nouvelle-Aquitaine	x	x	x	- participation à 3 réunions annuelles avec le référent départemental et webinaires régionaux.
		2023-2024	2024-2025	2025-2026	Résultats
3-Suivi du site et du DOCOB	3-1 Suivi biologique du site	x	x	x	- suivis biologiques réalisés annuellement sur le site ; résultats analysés et présentés en comité de pilotage.
	3-2 Suivi socio-économique	x	x	x	- veille continue assurée sur les activités et projets à proximité du site.
	3-3 Mise à jour du DOCOB et des FSD				
	Digitalisation des couches cartographiques				
	Mise à jour du formulaire standard des données	x			- FSD mis à jour et transmis à la DREAL, en attente d'instruction auprès du MNHN
	3-4 Évaluation de l'état de conservation des sites	x	x	x	- aucune sollicitation des services de l'Etat
		2023-2024	2024-2025	2025-2026	Résultats
4- Assistance administrative	4-1 Organisation des COPILs				
	Organisation	x	x	x	- en accord avec la Région, le COPIL intermédiaire pendant le marché n'a pas eu lieu, faute de sujets à aborder en COPIL
	Préparation et présentation	x	x	x	- préparation et présentation systématique des bilans et actions en COPIL.
	Rédaction CR	x	x	x	- comptes rendus rédigés et diffusés après chaque COPIL.
	4-2 Elaboration de compte rendu et bilans				
	Elaboration d'un compte-rendu d'activité à mi-parcours	x	x	x	- comptes rendus d'activité intermédiaires réalisés.
	Elaboration du bilan d'animation annuel	x	x	x	- bilans d'animation annuels rédigés et transmis.
	Elaboration du bilan triennal d'animation			x	- bilan triennal d'animation réalisé.

Action non programmée

x

Action programmée et réalisée

x

Action programmée et partiellement réalisée

x


Action programmée et non réalisée

BILAN CARTOGRAPHIQUE

Un bilan cartographique des actions de communication, est présenté dans la figure suivante.

Aucune action contractuelle n'a été engagée pendant la période.

Action de sensibilisation, d'information et de communication - Bilan 2023-2026

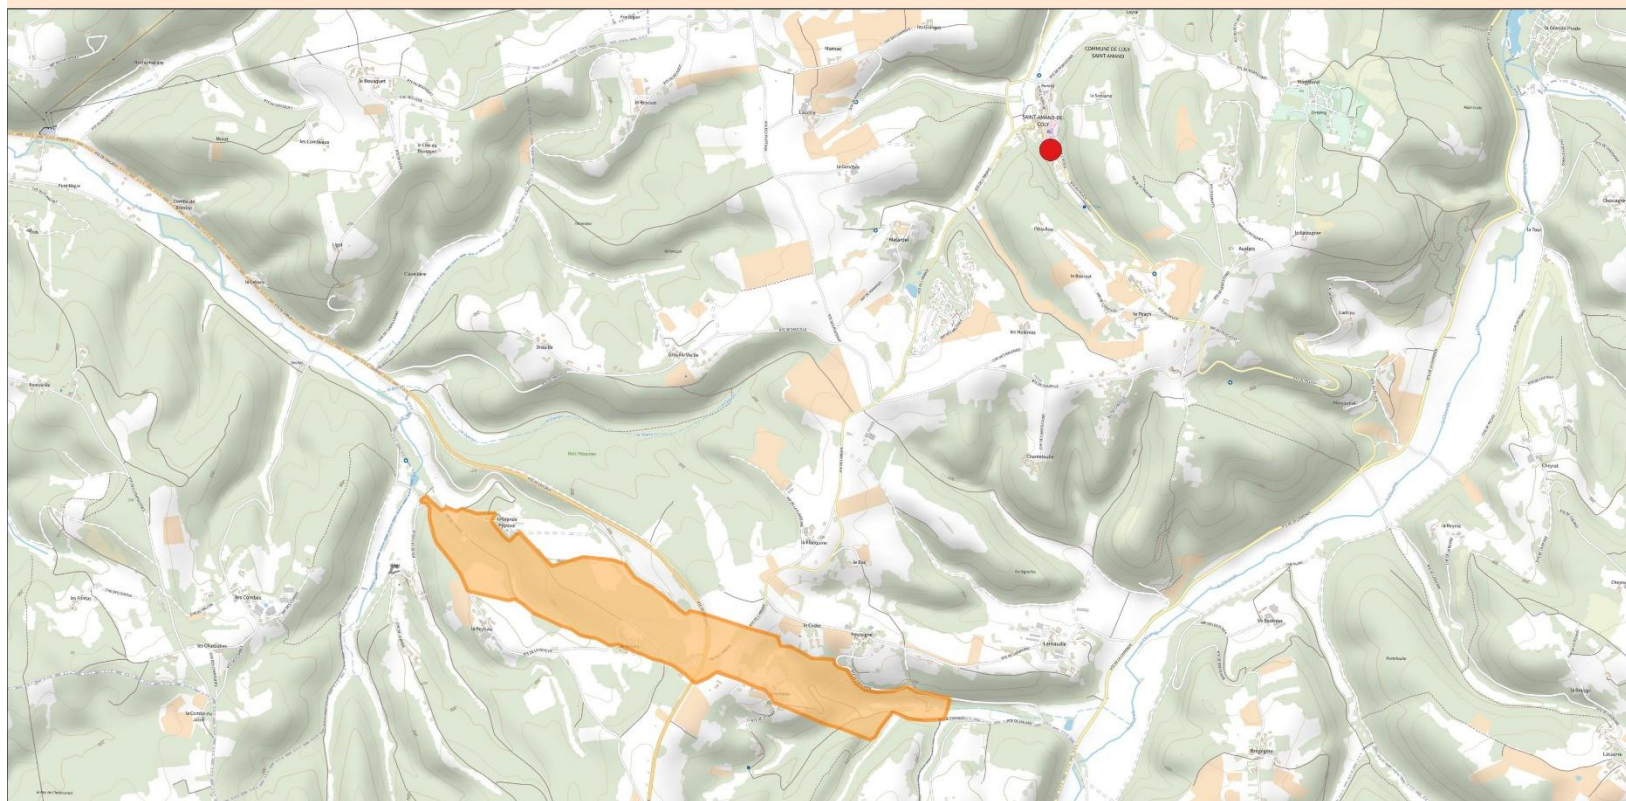

Légende

 Périmètre du site Natura 2000

Action

 Animation



Figure 4: Bilan cartographique des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la période 2023-2026

ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DETAILLE PAR ACTION

Le DOCOB du site Natura 2000 vise la conservation des espèces d'intérêt communautaire, l'évaluation de la conservation des espèces à travers des actions d'amélioration des connaissances de valorisation et de sensibilisation.

Les résultats obtenus pour chaque action, **depuis le début de la mise en œuvre de l'animation sur site, c'est-à-dire depuis 2008** sont détaillés dans le Tableau 3 et le Tableau 4 ci-après.

Tableau 3: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB

Code	Objectifs	Code action	Intitulé action	Financements possibles	Priorité	Indicateur	Résultats
O ₁	Conserver les espèces d'intérêt communautaires						
O ₁₁	Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies de chauves-souris	GH1	Mise en place d'un périmètre de protection et information	CN 2000	1	Fermeture réalisée / Panneau d'information posé	Site sécurisé en 2010 et 2011
		GH2	Entretien de l'accès sud-est du tunnel	CN 2000	1	Nombre d'interventions réalisées	Entretien réalisé en 2010 et 2011
Code	Objectifs	Code action	Intitulé action	Financements possibles	Priorité	Indicateur	Résultats
O ₂	Evaluer la conservation des espèces						
O ₂₁	Suivre les colonies de chauves-souris sur l'ensemble du cycle biologique	SE1	Suivi des populations de chiroptères du tunnel	Animation N2000 Hors Contrat	1	Nombre de suivis réalisés	Suivis biologiques réalisés annuellement ; rapports produits et présentés en comité de pilotage.
O ₂₂	Suivre les conditions hygrothermiques du site	SE2	Acquisition, pose et suivi des détecteurs de suivi hygrothermique (intérieur et extérieur)	Animation N2000 Hors Contrat	1	Matériel acheté, suivi réalisé	Capteurs installés en 2010 et 2011
O ₂₃	Améliorer les connaissances concernant la présence des colonies en hiver	SE3	Pose de nichoirs adaptés aux Barbastelles à proximité du site	Animation N2000	2	Nombre de nichoirs achetés et installés	Non financé, non réalisé
		SE4	Suivi bi-mensuel en hiver des populations de chiroptères	Animation N2000	1	Nombre de suivis réalisés	Non réalisé
O ₂₄	Connaître la présence des deux espèces en période de reproduction	SE5	Pose de filets de captures à proximité du site	Animation N2000	1	Opération réalisée	Non financé, non réalisé
		SE6	Suivi par radio-pistage de Barbastelles capturées	Hors Contrat	1	Opération réalisée	Non financé, non réalisé
		SE7	Recherche de gîtes estivaux (Barbastelles et Grands Rhinolophes) à proximité	Animation N2000 Hors Contrat	2	Nombre de localités prospectées, nombre de colonies estivales recensées	Réalisé en 2011, 2014 et 2021. Prospections non exhaustives.
O ₂₅	Evaluer la conservation des espèces (bilan et expertise)	SE8	Reprise et synthèse des données de suivi	Animation N2000	1	Analyse effectuée, rapport rédigé	Évaluation de l'état de conservation des espèces réalisée à partir des suivis biologiques.
Code	Objectifs	Code action	Intitulé action	Financements possibles	Priorité	Indicateur	Résultats
O ₃	Valoriser et sensibiliser						
O ₃₁	Mettre en place de la sensibilisation ex-situ	VA1	Mettre en place de la sensibilisation ex-situ	Animation N2000	2	Nombre de panneaux installés, nombre d'animations réalisées	4 animations réalisées: en 2011, 2012, 2014 et 2023, 4 panneaux installés: 2 panneaux de sensibilisation installés en 2011 et 2 panneaux d'information installés en 2025

Tableau 4: Tableau de bord de la mise en œuvre des actions du DOCOB – suite

Code	Objectifs	Code action	Intitulé action	Financements possibles	Priorité	Indicateur	Résultats
O ₄	Animer le DOCOB						
O ₄₁	Préparer la mise en œuvre du document d'objectifs	AN1	Information et communication sur les mesures de gestion	Animation N2000	1	Action réalisée	Action réalisée
		AN2	Identification des besoins financiers	Animation N2000	1	Action réalisée	Action réalisée
O ₄₂	Mettre en œuvre des mesures contractuelles	AN3	Aide au montage de dossier	Animation N2000	1	Nombre de contrats déposés	2 contrats réalisés en 2010 et 2011, Non programmé sur la période
		AN4	Suivi de l'instruction	Animation N2000	1	Action réalisée	Réalisé en 2010 et 2011, Non programmé sur la période
		AN5	Aide à la mise en œuvre technique des mesures	Animation N2000	1	Action réalisée	Réalisé en 2010 et 2011, Non programmé sur la période
		AN6	Suivi de la consommation financière et consolidation des besoins	Animation N2000	1	Action réalisée	Réalisé en 2010 et 2011, Non programmé sur la période
O ₄₃	Mettre en œuvre des mesures hors contrat	AN7	Ingénierie financière	Animation N2000	1	Action réalisée	Réalisé en 2010 et 2011, Non programmé sur la période
		AN8	Elaboration du cahier des charges techniques	Animation N2000	1	Nombre de cahier des charges rédigés	Non réalisé
		AN9	Conduite d'opération	Animation N2000	1	Action réalisée	Non réalisé
O ₄₄	Coordonner, réaliser la synthèse et le bilan	AN10	Bilan et évaluation des actions et des contrats	Animation N2000	1	Action réalisée	Action réalisée
		AN11	Préparation et animation du comité de Pilotage	Animation N2000	1	Nombre de réunions réalisées	6 COPILs réalisés depuis le début de l'animation (dont 2 durant la dernière phase d'animation)
		AN12	Coordination des avis techniques	Animation N2000	1	Action réalisée	Non réalisé

DISCUSSION DES RESULTATS

Les tableaux de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB (Tableau 5, Tableau 6 et Tableau 7 ci-après), présentent de manière détaillée la mise en œuvre du document d'objectifs, action par action, incluant l'analyse des résultats, les difficultés rencontrées, les forces et faiblesses des actions ainsi que l'évaluation de l'atteinte des objectifs.

Les principales opérations de contractualisation ont été réalisées en 2010 et 2011 (sécurisation physique, pose de panneaux et entretien des entrées du tunnel). Depuis, aucune action de contractualisation n'a été réalisée. Récemment, une nouvelle possibilité de contractualisation a émergé concernant la sécurisation physique du site (suite aux constats d'un périmètre grillagé vieillissant et fragilisés par les fréquentes intrusions).

La taille du site et sa nature même limitent les actions possibles. Les actions d'amélioration des connaissances ne sont pas financées via l'animation du site Natura 2000 et celle-ci s'est cantonnée jusqu'en 2023 à des actions de suivis biologiques.

Les nouveaux crédits mobilisables laissent entrevoir de nouvelles opportunités d'actions.

Le DOCOB date de 2006, certaines actions, au vu des connaissances actuelles, apparaissent peu pertinentes.

Tableau 5: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB

Objectif DOCOB	Action DOCOB	Actions mises en œuvre et résultats	Analyse des résultats	Difficultés / solutions	Forces / faiblesses de l'action	Évaluation : atteinte des objectifs
O1 – Conserver les espèces d'intérêt communautaires	GH 1 - Mise en place d'un périmètre de protection et information	Sécurisation physique du site réalisée (2010 et 2011) Périmètre réglementaire défini en 2013 (APPB)	Périmètre grillagé installé tout autour des deux entrées, matérialisant un barrière pour l'accès au site	Difficultés : intrusions répétées --> périmètre grillagé fragilisé, site fréquenté, espèces dérangées, défaut de signalisation sur l'APPB Solution : Reprise du périmètre (contrat Natura 2000), affichage du règlement sur site (APPB avec règlement & sanctions)	Forces : Dispositif visuel, Faiblesses : Dispositif de contractualisation lourd à mettre en place, site isolé, grillage facilement fracturable	Objectif atteint
	GH 2 - Entretien de l'accès sud-est du tunnel	Entretien des abords du tunnel réalisé (2010 et 2011)	Condition de température optimale pour la Barbastelle d'Europe au sein du tunnel	Difficultés : Solution :	Force : Faiblesse : Action récurrente à planifier, défaut de financement	
O2 – Evaluer la conservation des espèces	SE 1 - Suivi des populations de chiroptères du tunnel	Suivis biologiques réalisés annuellement	Les populations se maintiennent, le tunnel joue toujours son rôle de site d'hibernation pour le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d'Europe	Difficultés : Réactivité dans la date en fonction des conditions météorologiques Solution :	Force : Données fiables Faiblesses : Dépendante des contraintes calendaires	Objectif partiellement atteint
	SE 2 - Acquisition, pose et suivi des détecteurs de suivi hygrothermique (intérieur et extérieur)	Suivi des conditions abiotiques à l'intérieur du gîte en 2010 et 2011	Vision annuelle des variations de température en différents points du tunnel	Difficultés : Défaillance du capteur d'humidité, matériel non adapté Solution : Acquisition de matériel plus performant	Force : Données fiables Faiblesse : Données anciennes, à réactualiser, financement à rechercher	
	SE 3 - Pose de nichoirs adaptés aux Barbastelles à proximité du site	Non réalisé, action peu pertinente		Difficultés : montage du contrat complexe (parcellaire morcelé) Solution :	Force : Faiblesses : Action non pertinente, à supprimer ?	
	SE 4 - Suivi bi-mensuel en hiver des populations de chiroptères	Non réalisé, non prévu pendant la période		Difficultés : Action non financée Solution : Réponse à Appel à projet pour recherche de financement	Force : Données fiables permettant de mettre en évidence le rôle du tunnel pour l'hibernation de la Barbastelle d'Europe et l'impact des températures Faiblesse : Action chronophage	
	SE 5 - Pose de filets de captures à proximité du site	Non réalisé, non prévu pendant la période		Difficultés : Action non financée Solution : Réponse à Appel à projet pour recherche de financement	Force : Evaluation du rôle du tunnel pour certaines espèces (swarming) avec la récolte de données biométriques Faiblesse :	

Tableau 6: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB - suite

Objectif DOCOB	Action DOCOB	Actions mises en œuvre et résultats	Analyse des résultats	Difficultés / solutions	Forces / faiblesses de l'action	Évaluation : atteinte des objectifs
	SE 6 - Suivi par radio-pistage de Barbastelles capturées	Non réalisé, non prévu pendant la période		Difficultés : Action non financée Solution : Réponse à Appel à projet pour recherche de financement	Force : connaissance du réseau de gîtes à Barbastelle à proximité du site Faiblesses : action coûteuse et chronophage (télémétrie) nécessitant des compétences et des autorisations spécifiques	
	SE 7 - Recherche de gîtes estivaux (Barbastelles et Grands Rhinolophes) à proximité	Amélioration des connaissances sur les espèces en période estivale (ex situ)	Recherches partielles réalisées dans le cadre de différents projets de territoires (ABC CCVH et Appel à projets)	Difficultés : Accès aux propriétés privées non autorisé Solution : Soutien local pour accès aux propriétés privées,	Force : connaissance du réseau de gîtes à Rhinolophe à proximité du site Faiblesse :	
	SE 8 - Reprise et synthèse des données de suivi	Données compilées en BDD (transmission SINP), présentées en COPIL	Données robustes permettant l'analyse des tendances et des fonctionnalités du site ; veille sur le périmètre grillagé.	Difficultés : Solution :	Force : Données fiables Faiblesse :	
O3 – Valoriser et sensibiliser	VA 1 - Mettre en place de la sensibilisation ex-situ	Animation à destination du grand public et des scolaires	1 seule animation réalisée pendant la période 2023-2026	Difficultés : site sensible, non ouvert au public --> volonté de ne pas trop communiquer. Faible diversité d'actions de communications proposées Solution : proposer de nouveaux types d'animation ? Diversifier les supports de communication (appel à un prestataire extérieur ?)	Forces : impact sur le grand public et les plus jeunes, connaissance des richesses locales Faiblesses : impact ponctuel selon le support (animation vs support physique)	Objectif partiellement atteint
O4 – Animer le DOCOB	AN 1 - Information et communication sur les mesures de gestion	Animation assurée sur l'ensemble de la période ; COPIL organisés ; bilans produits.	Gouvernance fonctionnelle permettant l'ajustement des actions.	Difficultés : Site peu étendu et sensible, peu d'actions envisageables Solution :	Forces : Animation continue Faiblesses :	Objectif atteint
	AN 2 - Identification des besoins financiers					
	AN 3 - Aide au montage de dossier					
	AN 4 - Suivi de l'instruction					
	AN 5 - Aide à la mise en œuvre technique des mesures					
	AN 6 - Suivi de la consommation financière et consolidation des besoins					
	AN 7 - Ingénierie financière					
	AN 8 - Elaboration du cahier des charges techniques					

Tableau 7: Tableau de synthèse de la mise en œuvre des actions du DOCOB - suite et fin

Objectif DOCOB	Action DOCOB	Actions mises en œuvre et résultats	Analyse des résultats	Difficultés / solutions	Forces / faiblesses de l'action	Évaluation : atteinte des objectifs
	AN 9 - Conduite d'opération					
	AN 10 - Bilan et évaluation des actions et des contrats					
	AN 11 - Préparation et animation du comité de Pilotage					
	AN 12 - Coordination des avis techniques					

PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PHASE D'ANIMATION

Les enseignements tirés de la période triennale conduisent à :

- ✓ consolider les actions de suivi biologique et d'assistance technique,
- ✓ recentrer les actions de sensibilisation vers des formats ciblés et efficaces (poster, flyer),
- ✓ programmer un contrat Natura 2000 pour concourir aux objectifs de site (sécurisation physique)
- ✓ maintenir une capacité d'ajustement des actions en fonction des résultats observés.

Ces orientations visent à optimiser l'efficacité de l'animation dans un cadre budgétaire et opérationnel maîtrisé.

Les propositions d'action pour la période 2026-2029 sont les suivantes :

INFORMATION ET SENSIBILISATION

- ✓ Organisation et animation de sortie nature à destination du grand public ou des scolaires
- ✓ Création et diffusion d'un poster du site
- ✓ Création et implantation de panneaux de sensibilisation et d'information aux entrées du tunnel
- ✓ Communication autour des actions réalisées
- ✓ Animation du site internet

CONTRATS ET CHARTES NATURA 2000

- ✓ Montage d'un contrat Natura 2000 de sécurisation physique du tunnel
- ✓ Proposition et signature de la Charte Natura 2000

ACCOMPAGNEMENT ET ANIMATION TERRITORIALE

- ✓ Assistance à l'application du régime d'évaluation des incidences
- ✓ Accompagnement des acteurs du territoire et des collectivités dans leurs éventuels projets en faveur de la biodiversité

SUIVIS SCIENTIFIQUES / INVENTAIRES

- ✓ Suivis biologiques

SUIVI DU DOCOB ET DE L'ANIMATION

- ✓ Mise à jour du FSD
- ✓ Organisation des COPIIL
- ✓ Rédaction des bilans



Un outil au service de la biodiversité, des paysages et de l'économie de territoires



Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
www.cen-nouvelle-aquitaine.org

Siège social : 6 ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence

Tél : 05 55 03 29 07
siege@cen-na.org



Contact :
CEN Nouvelle-Aquitaine
Antenne Dordogne
212 Bd des Saveurs - 24660 Coulounieix-Chamiers
Tél : 05 53 81 39 57
antenne24@cen-na.org

avec le concours financier de



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

*La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire*
